



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT

UAN/SPP/01-067/2021
Tepic, Nayarit; 07 de abril del 2021.

ASUNTO: Remisión del
1er. Informe trimestral, FAM 2021.

Dr. Isaias Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
PRESENTE

Acuse

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del 1er. Informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo del 2021.

Se envía anexo un CD que incluye el archivo con el reporte de avances de infraestructura del FAM ejercicio fiscal 2021 en formato PDF y Excel.

De igual forma, se hace llegar la información vía correo electrónico, a las siguientes direcciones: rocloc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y jcarlosv@nube.sep.gob.mx.

Sin otro en particular, agradezco la atención y quedo a disposición para cualquier duda o aclaración.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy
Secretario de Planeación y Programación



Cop. Expediente



Secretaría de Planeación
y Programación

Torre de Rectoría, 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit.

☎ (311) 211-55-00 Ext. 6735
✉ planeacion@uan.mx

FAM

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Trimestro reportado

1er.

FECHA DE CORTE: 11/03/202

Departamento de Autonomía de Nayarit

Entidad federativa: Navarra

Chave Ins: 911 18MSU0019H

Nombre: Enri Martín Jimenez Godoy
Cargo: Secretaria de Planeación y Programación
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
Correo electrónico: enri.jimenez@uanl.mx

Planeación

RESPONSABLES

Ubrías y Mantenimiento

Nombre: Ernesto Navarrete Méndez
Cargo: Director de Obra Universitaria
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8638
Correo electrónico: er0407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto		Español/ equipo		Metros cuadrados		Acciones que sustentan el avance		Acciones por realizar		% de avance		Fechas ³		Observaciones		Si ya fue inaugurada				Cuenta con Actas	
		Cantidad										Inicio		Termino							
Edificio para laboratorios (primera etapa, construcción en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas)		1		124.48								GLOBAL DEL PROYECTO									
Laboratorios		1		133.88																	
Áreas comunes		1		73.60																	
Sanitarios		2		48.00								0%									
								Se recibieron las primeras ministraciones del recurso, sin embargo, el monto aún no es suficiente para el pago de anticipos correspondientes al 50% del monto por construir.													
								Una vez que se cuente con el recurso para el 50% de anticipo se comenzará con los procedimientos y avances con las construcciones.													
TOTAL		5		379.76								GLOBAL DEL PROYECTO									
Aulas		4		192.00																	
Áreas comunes		1		70.00																	
Sanitarios		2		48.00								0%									
TOTAL		7		310.00																	
Edificio de aulas (primera etapa, construcción en la Unidad Académica de Enfermería)		2		6,464,619.45																	
TOTAL		11,864,619.45		50.00																	

[illegible]

La Unión Asociación de la Ciudad de Iquitos ofrece a los estudiantes de la Universidad de Iquitos un espacio de formación y capacitación en el área de la salud pública, con el fin de mejorar la calidad de la atención médica y de la salud pública en general.

Es importante que las fechas de inicio y término estén a su vez expresadas en dos dígitos del mil y mil.

Arg. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

2021

FAM

FONDO DE ASIGNACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre reportado

1er.

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

1 Nombre de la obra:

Edificio para laboratorios (primera etapa, construcción planta baja) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas



CROQUIS DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Porcentaje de avance

0%

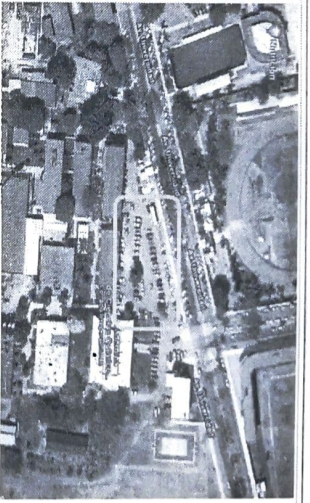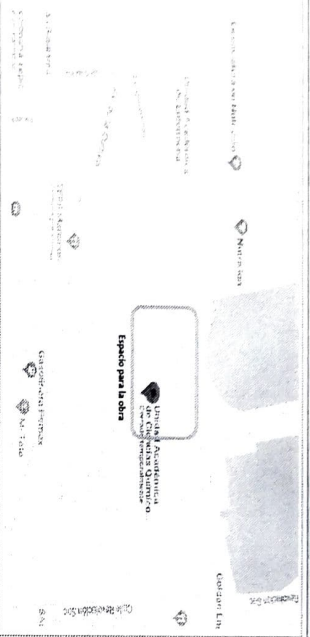

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:

AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6000. TEPIC, NAYARIT

F1: Fecha principal

F2: Actual

F3: Fecha posterior

F4: Entidad

F5: Proceso de validación

M. C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Aq. Emilio Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

Es muy importante que se anexen reportes fotográficos de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se pueden copiar tantas plantillas como sea necesario. Para el seguimiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2021

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Trimestre reportado

1er.

FECHA DE CORTE: 31/03/2021

2 Nombre de la obra

Edificio de aulas (primera etapa, construcción planta baja), en la Unidad Académica de Enfermería

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



CRONOQUI DE LOCALIZACION

UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO



Presidencia de la República

0%

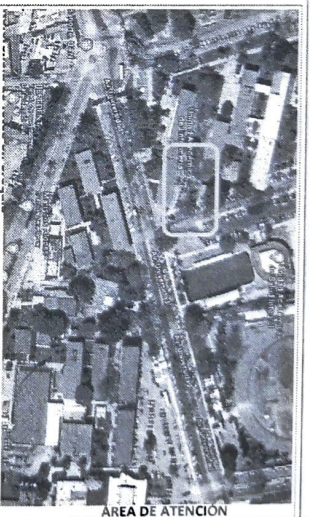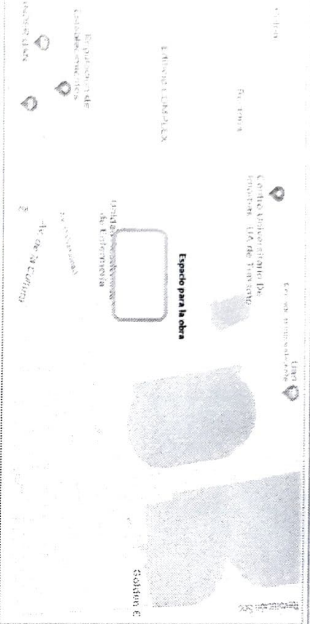

AREA DE ATENCION

AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 8000, TEPIC, NAYARIT

Comentarios de los trabajos realizados:

F1: Fachada principal

F2: Interior

F3: Fachada posterior

F4: Entada

F5: Interior de aula

M. C. Jorge Ignacio Peña González, Rector

Abg. Emilio Najarete Méndez, Director de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello, se anexa una plantilla, se podrá copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma forma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
