



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

UAN/SPP/01-065/2021
Tepic, Nayarit, 07 de abril del 2021.

ASUNTO: Remisión del 1er. Informe trimestral, FAM 2019 (remanentes de monetización).

Dr. Isaiás Elcarraraz Alvaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
PRESENTE

Acuse

Por medio del presente me permito hacer entrega formal del 1er. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo del 2021.

Se envía anexo un CD que incluye el archivo con el reporte de avances de infraestructura del FAM ejercicio fiscal 2019 (remanentes de monetización) en formato PDF y Excel.

De igual forma, se hace llegar la información vía correo electrónico, a las siguientes direcciones: rocio@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y icarlosv@nube.sep.gob.mx.

Sin otro en particular, agradezco la atención y quedo a disposición para cualquier duda o aclaración.

Reciba un cordial saludo.

S.E.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
RECIBIDO
15 ABR. 2021
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy
Secretario de Planeación y Programación

Dep. Expediente



Secretaría de Planeación
y Programación

Torre de Rectoría, 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit.

☎ (311) 211-8300 Ext. 4758
✉ planeacion@uan.edu.mx

2019

FAM

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCION DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Trimestre reportado
1er.
 FECHA DE CORTE: 31/03/2021



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
 Entidad federativa: Nayarit
 Clave Inst: 911-18MSU0079M

Nombre: Encl. Martín Jiménez Godoy
 Cargo: Secretario de Planeación y Programación
 Teléfono: 01 (311) 211 8600, ext. 8788
 Correo electrónico: encl.jimenez@uan.edu.mx

Nombre: Ernesto Navarrete Méndez
 Cargo: Director de Obra Universitaria
 Teléfono: 01 (311) 211 8600, ext. 8638
 Correo electrónico: encl407@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)											
		Obras de conformidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento				Proyecto sustentable	Espacio/ equipo	Cantidad				Metros cuadrados	Inicio		Termino	Si ya fue inaugurada	Cuenta con fotos del evento?	¿Cuándo y dónde se inauguró?	Entrega- Recepción (Acta Inauguro)	Acta Administrativa de Entrega- Recepción	Monto de Acta Administrativa					
1	Corredor Universitario (remodelación y equipamiento)					\$ 2,219,156.95	\$ 2,191,040.84	\$ 28,116.11			1	1800.00		Se concluyó la obra. Se remiten las actas de entrega.	Se está trabajando en la solicitud de la línea de captura para realizar el reintegro a la TESOFE.	100%	25/03/20	25/06/20	La obra se realiza con recursos de remanentes de monetización generados del recurso FAM 2019.										
TOTAL						\$2,219,156.95	\$2,191,040.84	\$28,116.11			1	1800.00																	
TOTAL						0	0.00																						

M. C. Jorge Aguayo, R. González Rueda

Aq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

1. La categoría los espacios que corresponden a la obra o proyecto se podrán anexar en un archivo como sea necesario.
 2. En cada sección se redactará de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.
 3. La importancia que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos, del mes y año.

2019

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FORMIO DE APORTACIONES MULTIMEDIA

REPORTE FOTOGRAFICO DEL IMPORTE DE AVANCE MENSUAL

GRUPO DE LOCALIZACIÓN


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Trimestre reportado
1er.
FECHA DE CORTE: 3/10/2021



FOROAJARDIN DE BUENOS

100%




ÁREA DE ATENCIÓN

AV. DE LA CULTURA S/N. COL. CENTRO C.P. 8500. TERC. MAYARIT.


FOTOS




F1: Fachada principal

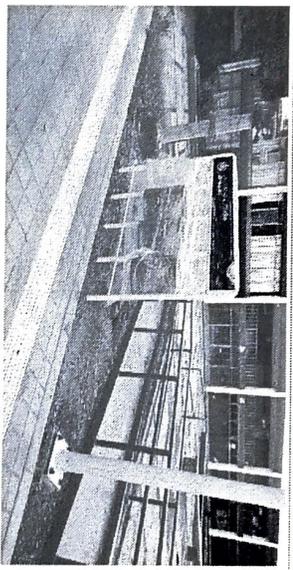


F2: Interior

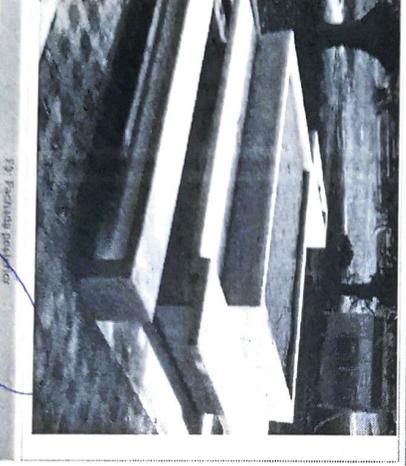

F3: Fachada posterior

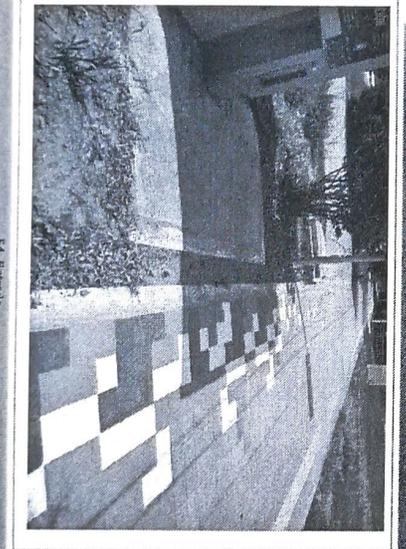

F4: Entrada

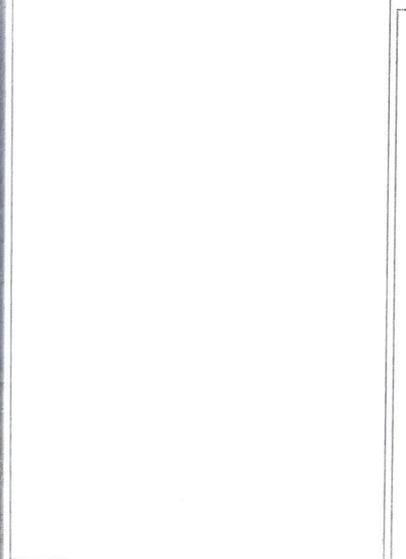

F5: Interior de aula

Comentarios de los trabajos realizados:
Se concluyó la obra al 100%.

M. C. Javier Utrabo Peña González, Rector

Aq. Ernesto Navarrete Méndez, Director de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario para equipamiento, mantenimiento, adecuaciones en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
