



UAN/SPPI/083/2022

Tepic, Nayarit; 08 de julio de 2022.

ASUNTO: Remisión del
2do. informe trimestral, FAM 2022.

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional, DGESUI.
PRESENTE

Por medio del presente me permito hacer entrega del 2do. informe trimestral de avance de obra, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2022; correspondiente al periodo 01 de abril al 30 de junio del 2022.

Se envía anexo el formato debidamente firmando y se realiza la entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones: rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, jcarlosv@nube.sep.gob.mx y dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx.

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



Universidad
Autónoma
de Nayarit

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy
Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

C.c.p. Expediente



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
Entidad federativa: Nayarit
Clave Inst 911: 18MSU0019M

Nombre: Erick Martín Jiménez Goody
Cargo: Secretario de Planeación y Programación
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
Correo electrónico: erik.jimenez@uan.mx

Nombre: Stephany Quezada González
Cargo: Directora de Obras y Mantenimiento
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8639
Correo electrónico: step33@hotmail.com

Datos de la Universidad
Planes
Obra y Mantenimiento

Nombre del proyecto	Prioridad	Tipo de proyecto				Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO				Observaciones	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas	
		Obras de infraestructura	Equipamiento	Adquisiciones y mejoras	Mantenimiento				¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguro?	Entrega-Recopón (Acta Inqui)	Acta Administrativa de Recepción		Monto de Acta Administrativa			
Edificio de aulas (segunda etapa), Unidad Académica de Enfermería	1					\$ 8,701,602.00	-	\$ 8,701,602.00						0%			
Edificio para laboratorios (segunda etapa) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas	2					\$ 4,130,022.00	-	\$ 4,130,022.00						0%			
						\$12,831,624.00	\$0.00	\$12,831,624.00									

Se tiene el recurso suficiente para comenzar la obra de la prioridad 1

Se están realizando los procedimientos administrativos para iniciar con el proceso de licitación de la obra.

Una vez que se tengan aprobados los proyectos se comenzará con la prioridad 2.

Norma Gálvez
Dra. Norma Lilian Galván Meza, Rectora

Arq. Stephany Quezada González, Directora de Obra Universitaria

1 Se aglutina los espacios que corresponden a la obra o proyecto. Se pueden agregar varias filas como sea necesario.

2 En esta sección se registran de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.



3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: día, mes y año.

2022
AÑO



Porcentaje de avance
0%

1
Nombre de la obra: **Edificio de aulas (segunda etapa), Unidad Académica de Enfermería**

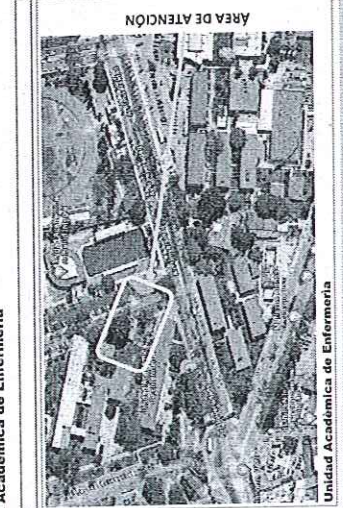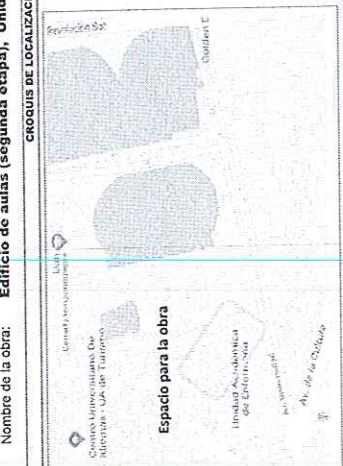

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO
AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P.
6300, TEPIC, NAYARIT.
Unidad Académica de Enfermería


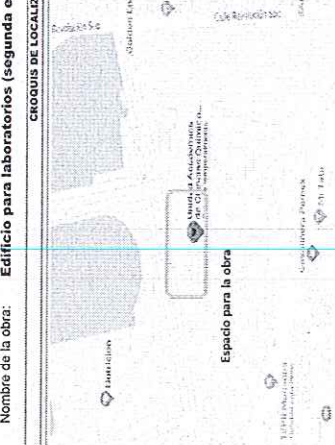
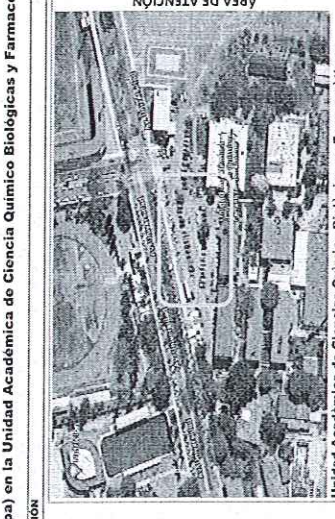
Comentarios de los trabajos realizados:	
F1: Fachada principal	F2: Interior
F3: Fachada posterior	F4: Entrada
F5: Interior de aula	F6: Interior de aula

Norma Galdames
Dra. Norma Liliani Galdames Meza, Rectora

Arq. Stophany Quezada González
Arq. Stophany Quezada González, Directora de Obra Universitaria

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

 Año: 2022 Porcentaje de avance: 0%	2 Nombre de la obra: Edificio para laboratorios (segunda etapa) en la Unidad Académica de Ciencia Químico Biológicas y Farmacéuticas	CROQUIS DE LOCALIZACIÓN 	AREA DE ATENCIÓN 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPEC, MAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.
--	---	--	--	--

Comentarios de los trabajos realizados:	
F1: Fuente principal	F2: lateral
F3: Fachada posterior	F4: Entrada
F5: Interior de sala Arq. Stephany Quevedo González, Directora de Obra Universitaria	

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.
