



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

UAN/SPPI/0416/2025  
Tepic, Nayarit; 09 de julio de 2025  
**ASUNTO:** Remisión del  
2do. informe trimestral  
2025, FAM 2025.

**MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ**  
**DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI.**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente me permito hacer entrega del 2do. informe trimestral 2025, de los proyectos autorizados, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2025; correspondiente al periodo 01 de abril al 30 de junio de 2025.

Se envía anexo el formato debidamente firmado y se entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

[dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx](mailto:dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx), [sconde@nube.sep.gob.mx](mailto:sconde@nube.sep.gob.mx), [cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx](mailto:cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx), [claudia.duenas@nube.sep.gob.mx](mailto:claudia.duenas@nube.sep.gob.mx) y [andrea.rangel@nube.sep.gob.mx](mailto:andrea.rangel@nube.sep.gob.mx)

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”**

**M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY**  
**SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA**



Universidad  
Autónoma  
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,  
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Archivo

**Secretaría  
de Planeación,  
Programación  
e Infraestructura**

**Torre de Rectoría 2do. Piso**  
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"  
C.P. 63000 Tepic, Nayarit  
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786



2025

SECRETARÍA FISCAL EN EL  
GOBIERNO FEDERAL

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Unidades y años que se reporta

2do Trimestre 2025

Fecha de actualización: 07/07/2025

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL  
DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Yucatán  
Entidad Federativa: Yucatán  
Clave SIU: 1818J0011M

Nombre: Erick Marín Jiménez  
Cargo: Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura  
Teléfono: 01 (911) 211 8500, ext. 8785  
Correo electrónico: erick.jimenez@uay.edu.mx

Ara. Stephany Quirós  
Ara. Stephany Quirós, Responsable de Planeación de Obra Única, Yucatán

M.S.P. Erick Marín Jiménez  
M.S.P. Erick Marín Jiménez, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Nombre: Stephany Quirós Quirós  
Cargo: Directora de Obra Única  
Teléfono: 01 (911) 211 8500, ext. 8638  
Correo electrónico: stepy3@uay.edu.mx

Dr. Norma Liana Gallegos  
Dr. Norma Liana Gallegos, Rectora

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

Nombre de la obra: Edificio para laboratorios (Terminación Instalaciones y acabados) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

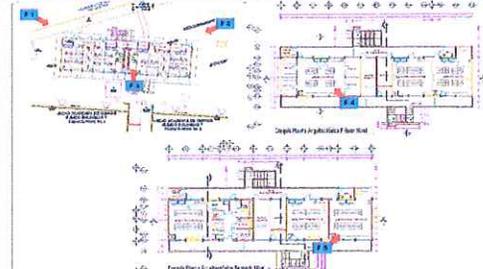

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPEC, NAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)

Observaciones:

Arq. Stephy González, Directora de Obra  
Universitaria

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación,  
Programación e Infraestructura

Dra. Norma Lilliana Galván Méza, Rectora

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100.00%

PROGRESO 2

Nombre de la obra: Edificio de aulas (tercera etapa: albañilerías, acabados e instalaciones) en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia.


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapaltla Km 3.5 no name, 63700 Compostela, Nay, Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)

Observaciones:

Arg. Stephany Arezada González, Directora de Obra Universitaria

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Dra. Norma Lilliana Galvan Meza, Rectora

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar varias pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRORIDAD: 3

Nombre de la obra:

Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albañilería del módulo principal y cimentación del auditorio)



Porcentaje de avance

0.00%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Artes.

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)



Fotografía 6 (F6)

Arq. Stephany Quezada González, Directora de Obra Universitaria

M.S.P. Eraldo Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Dra. Norma Lilliana Galyán Méza, Rectora

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestana, se podrán copiar tantas pestanas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y edificaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

100.00%

Nombre de la obra: **Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

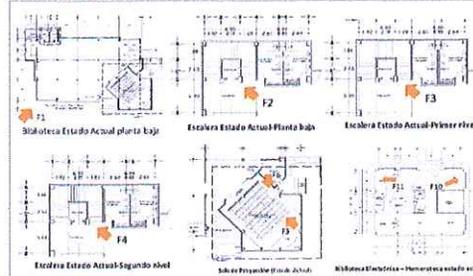

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca


FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)



Observaciones :

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO 4 Nombre de la obra: **Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

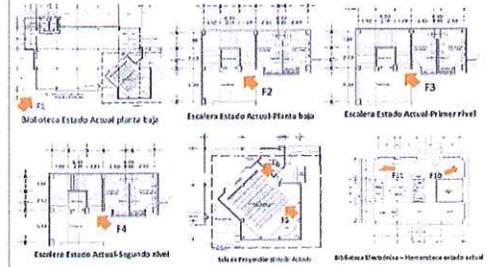

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca



Porcentaje de avance

100.00%



Fotografía 6 (F6)

Arq. Stephany González Sánchez, Directora de Obra Universitaria



Fotografía 7 (F7)

M.S.P. Erick Marín Jiménez-Sotoy, Secretario de Planeación, Coordinación e Infraestructura



Fotografía 8 (F8)

Dra. Norma Lilliana Galván Meza, Rectora

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE  
OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


0.00%

Nombre de la obra: **Construcción de Edificio de Aulas y Laboratorios para la Licenciatura de Enfermería en la Unidad Académica de Ahuacatlán**

GEOREFERENCIA O DROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



DROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

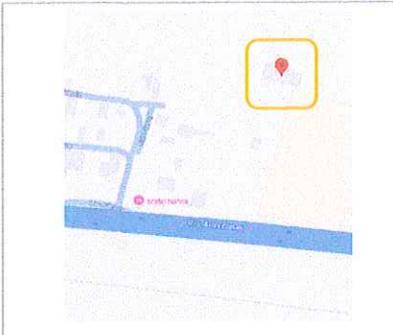

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Río Amazonas 167, Ahuacatlán, Navarra, Unidad Académica de Ahuacatlán

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)

Observaciones :

Arq. Stephany Ochoa Hernández, Directora de Obra  
Universitaria

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación,  
Programación e Infraestructura

Dra. Norma Lilliana Gabán Meza, Rectora

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PROYECTO: 6

Nombre de la obra: Construcción de Auditorio Universitario (Proyecto Estratégico)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

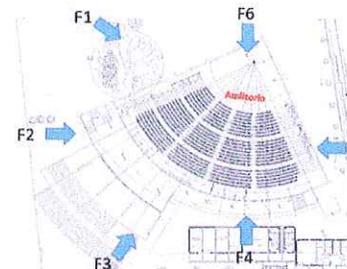

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIIC, NAYARIT

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)



Fotografía 6 (F6)

Observaciones :

Arq. Stephen Cruzada González, Directora de Obra Universitaria

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Dra. Norma Lilliana Galván López, Rectora

NOTA:

\* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pastaja, se pueden copiar las pastajas como sea necesario.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

2do Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 07/07/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PROYECTO 7 Nombre de la obra: **Construcción Centro de Aulas y Talleres para la Unidad Académica de Artes (Expresión Artística y Diseño Urbano)(Proyecto Estratégico)**

| GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO | CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO | UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS |
|---|--|---|
|   |  |   |

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Artes

FOTOS

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   |                   | Observaciones :   |
|                   |                   |                   |
| Fotografía 1 (F1) | Fotografía 2 (F2) | Fotografía 5 (F5) |

Arq. Stephany Osorio González, Directora de Obra Universitaria

M.S.P. Silvia María Jiménez Godoy, Secretario de Planeación, Programa de Infraestructura

Dra. Norma Lilliana Galván Maza, Rectora

NOTA: \* Es muy importante que se anexo reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
