



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/0612/2025
Tepic, Nayarit; 10 de Octubre de 2025
ASUNTO: Remisión del
3er. informe trimestral
2025, FAM 2025.

MTRA. CYNTHIA RUANO MÉNDEZ
DIRECTORA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI.
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito hacer entrega del 3er. informe trimestral 2025, de los proyectos autorizados, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2025; correspondiente al periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2025.

Se envía anexo el formato debidamente firmado y se entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y andrea.rangel@nube.sep.gob.mx

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”



Universidad
Autónoma
de Nayarit

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Archivo

**Secretaría
de Planeación,
Programación
e Infraestructura**

Torre de Rectoría 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786

2025

EFERENCIA FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance
26.00%


PROYECTO 1

Nombre de la obra:
Edificio para laboratorios (Terminación: instalaciones y acabados) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

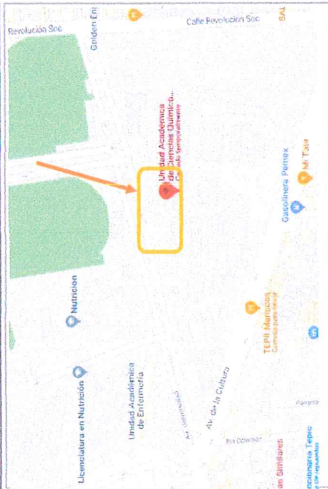


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

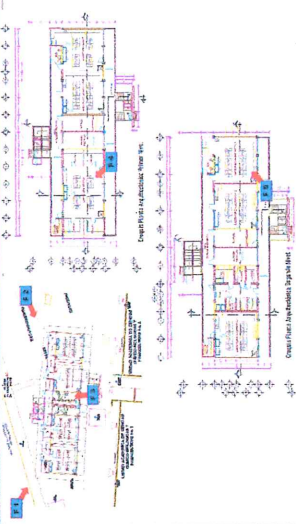


Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL CENTRO C.P. 6800, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.


FOTOS




Fotografía 1 (F1)

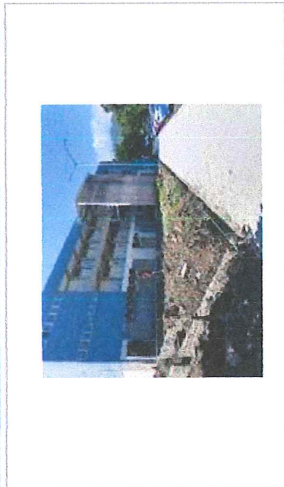

Fotografía 2 (F2)




Observaciones:

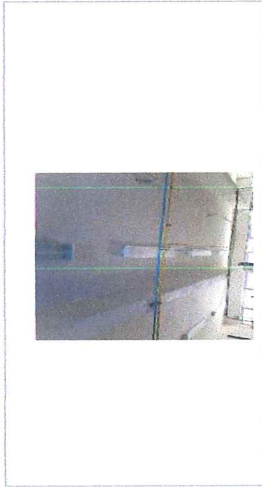

Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)

Arq. Stephyany Quezada González, Directora de Obra Universitaria

Dra. Norma Lilliana Guzmán Jacez, Rectora

M.S.P. Erick Murillo Jimenez, Secretario de Planeación, Organización e Infraestructura

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

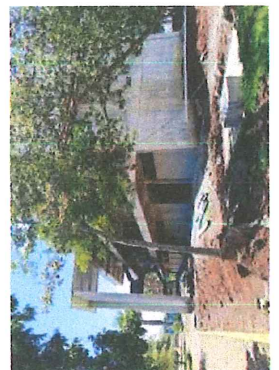 <p>Porcentaje de avance 100.00%</p>	<p>PROPIEDAD 2</p> <p>Nombre de la obra: Edificio de aulas (tercera etapa: albanilerías, acabados e instalaciones) en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia.</p> <p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapulla Km. 3.5 no name, 63700 Compostela, Nayar, Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia</p>
FOTOS			
 <p>Fotografía 1 (F1)</p>	 <p>Fotografía 2 (F2)</p>	<p>Observaciones:</p>	 <p>Fotografía 3 (F3)</p>
 <p>Fotografía 4 (F4)</p>	 <p>Fotografía 5 (F5)</p>	<p>M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura</p>	<p>Arq. Stephany Guzmán González, Directora de Obra Universitaria</p>

NOTA:
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestanía, se podrán copiar tantas pestanías como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adyacencias, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



PROYECTO: 3

Nombre de la obra: Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albanilería del módulo principal y cimentación del auditorio)


REFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Planta de Conjunto
Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, MAYARIT, Unidad Académica de Artes

Porcentaje de avance
12.00%

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)

Dr. Stephany Desea González, Directora de Obra Universitaria

Fotografía 5 (F5)

Dr. Norma Lilliana Guzmán Mejía, Rectora

Fotografía 6 (F6)

M.S.P. Erick Meléndez Cruz, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
CUBRÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance
100.00%

4 Nombre de la obra: **Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura**

4 CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

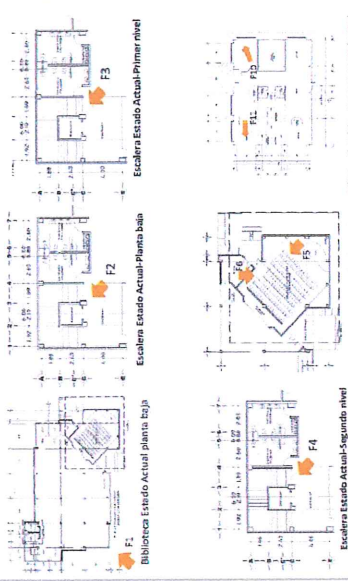


Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPEC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca

FOTOS




Fotografía 1 (F1)

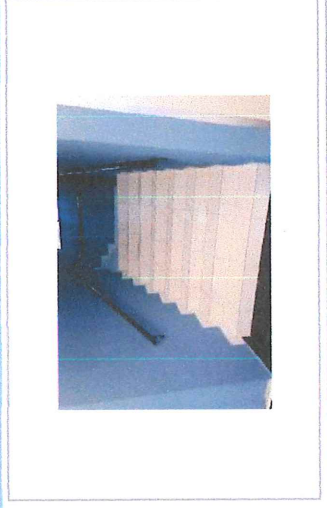

Fotografía 2 (F2)

Observaciones :

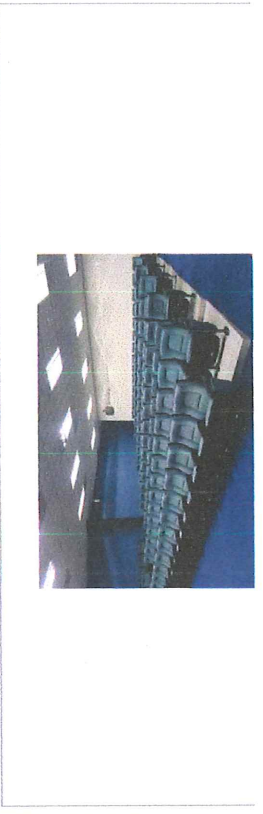

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025



Porcentaje de avance

100.00%

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO: 4 Nombre de la obra: Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca

Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)



2025

EJERCICIO FISCAL BIENEL QUE OTORGÓ EL RECURSO



Porcentaje de avance

100.00%

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

4 Nombre de la obra: **Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura**

4 Nombre de la obra: **Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura**

4 Nombre de la obra: **Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura**

4 Nombre de la obra: **Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura**



Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6500, TEPIC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca



Fotografía 6 (F6)



Fotografía 7 (F7)



Fotografía 8 (F8)

Arq. Stephany Quezada González, Directora de Obra
Universitaria

Dra. Norma Liliapa Saizán Meza, Rectora

M.S.P. Erick Martín Jiménez Góngora, Secretario de Planeación,
Programación e Infraestructura

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y subestaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

RECURSOS FINANCIEROS QUE
ORDINA EL RECURSO

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 19/10/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO 5

Nombre de la obra:

Construcción de Edificio de Aulas y Laboratorios para la Licenciatura de Enfermería en la Unidad Académica de Ahuacatlán


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO




Porcentaje de avance

0.00%

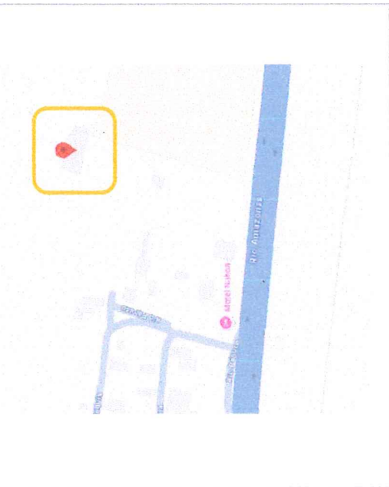


Dirección Postal: Río Amazonas 197, Ahuacatlán, Nayarit, Unidad Académica de Ahuacatlán

FOTOS

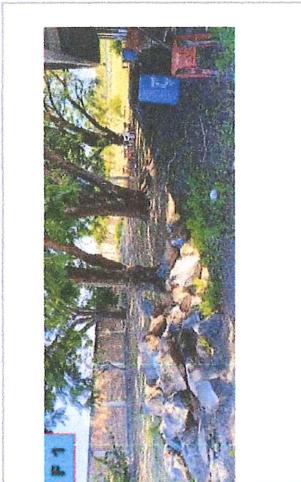


Fotografía 1 (F1)

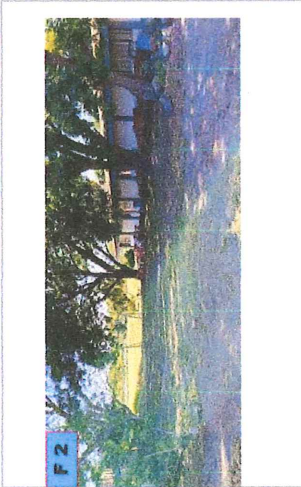

Fotografía 2 (F2)


Observaciones :

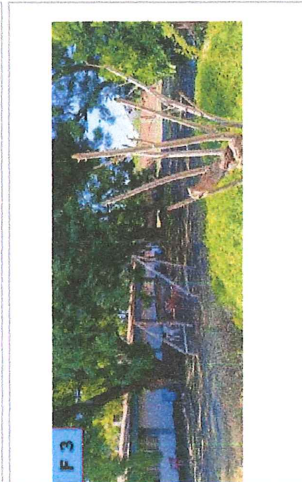

Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)

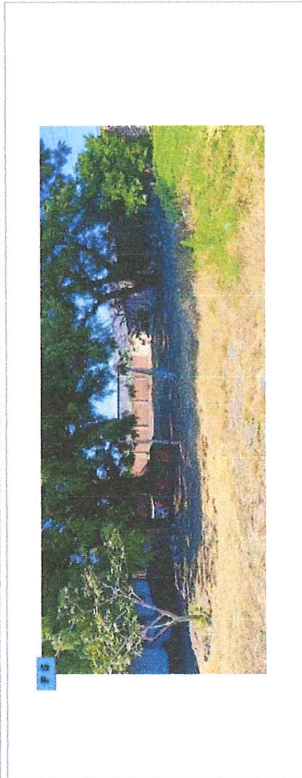

Fotografía 5 (F5)

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
 OTORGO EL RECURSO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
 3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PROYECTO

S


Nombre de la obra:

Construcción de Edificio de Aulas y Laboratorios para la Licenciatura de Enfermería en la Unidad Académica de Ahuacatlán

GEOFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

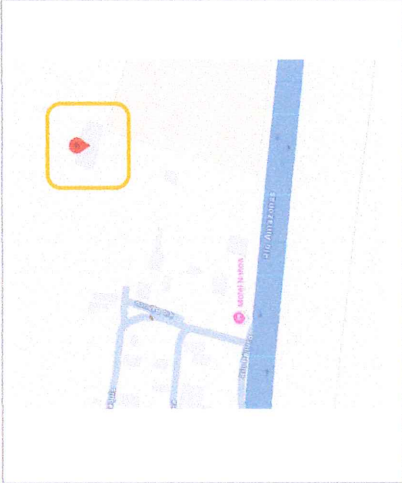

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Río Amazonas 187, Ahuacatlán, Nayarit, Unidad Académica de Ahuacatlán

Arq. Stephany Guzmán González, Directora de Obra
 Universitaria

M.S.P. Erick Martín Jiménez Galay, Secretario de Planeación,
 Programación e Infraestructura

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, en la cual se describen los puntos de referencia, así como se anexa el croquis de ubicación. Para el equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

ERANCIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance
27.00%

Prioridad 6


Nombre de la obra:

Construcción de Auditorio Universitario (Proyecto Estratégico)


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

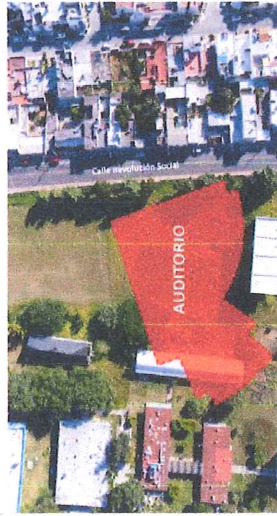

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

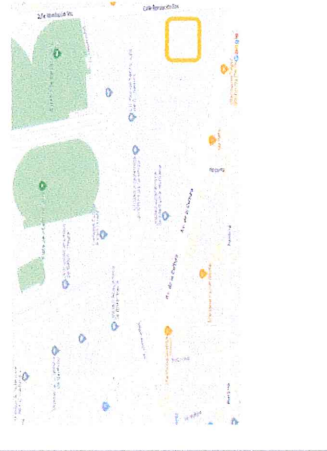


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

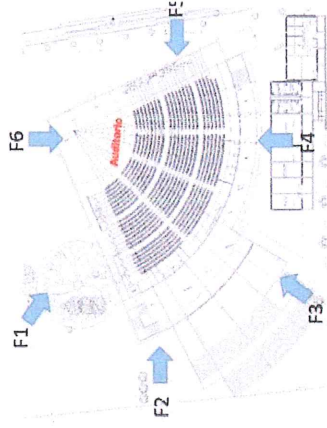

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300. TEPIC, NAYARIT

FOTOS

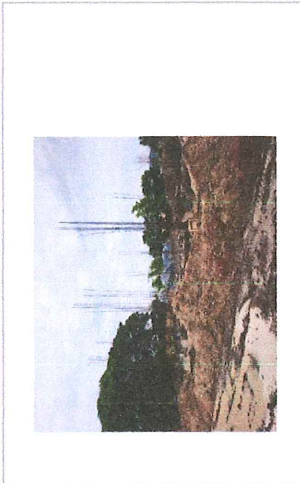

Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)




Observaciones :



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)

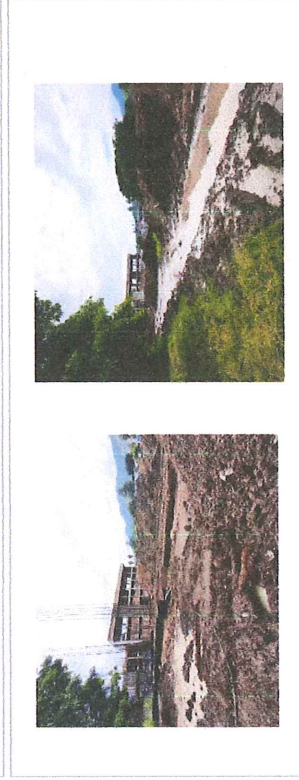

Fotografía 5 (F5)

Fotografía 6 (F6)

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/11/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL




Porcentaje de avance
27.00%


PROYECTO

6 Nombre de la obra: **Construcción de Auditorio Universitario (Proyecto Estratégico)**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

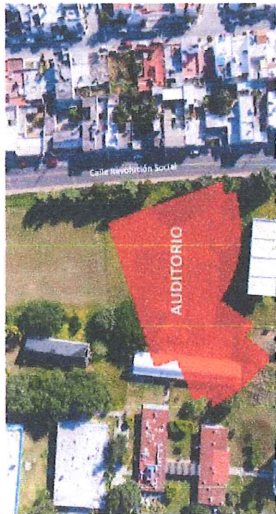

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

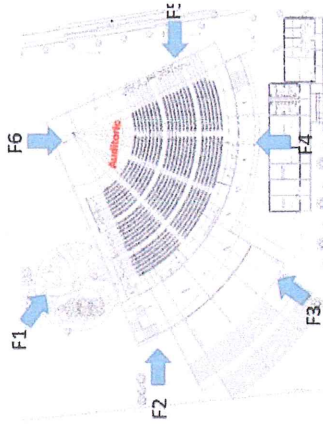

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT

Arq. *Stephany Gispardo González*
Directora de Obra
Universitaria

Norma Lilliana Galvan Tronco
Dra. Norma Lilliana Galvan Tronco, Rectora

M.S.P. Erick Marth Williams Gossoly
M.S.P. Erick Marth Williams Gossoly, Secretario de Planeación,
Programación e Infraestructura

NOTA:

* Es muy importante que se anexa reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se pedirá conjar bridas pesadas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y subestaciones, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

EREGICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

7

Nombre de la obra:



Construcción Centro de Aulas y Talleres para la Unidad Académica de Artes (Expresión Artística y Diseño Urbano)(Proyecto Estratégico)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Porcentaje de avance
35.00%

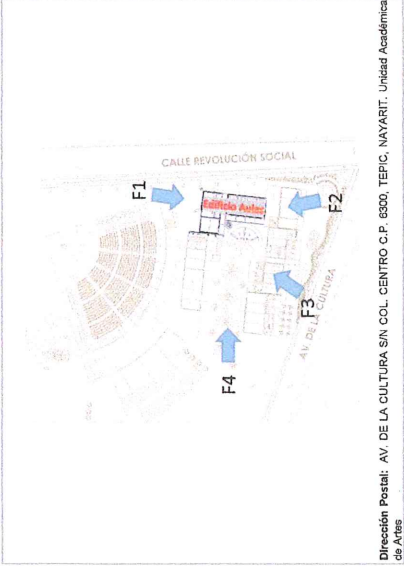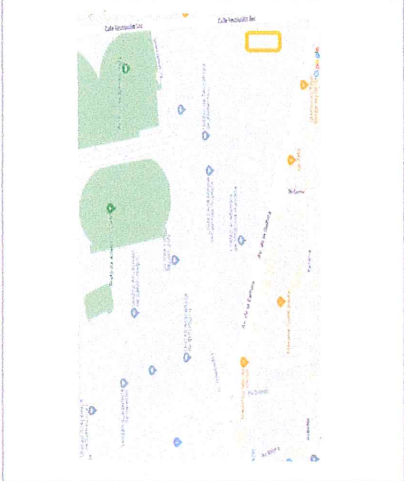

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6800, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Artes

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)

Observaciones :

Observaciones :

Fotografía 5 (F5)

2025
EJERCICIO FINANCIERO DEL QUE SE OTORGA EL RESERVA

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
3er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 10/10/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO: 7 Nombre de la obra: **Construcción Centro de Aulas y Talleres para la Unidad Académica de Artes (Expresión Artística y Diseño Urbano)(Proyecto Estratégico)**

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT, Unidad Académica de Artes

Arq. Stephany *[Firma]* Cossío, Directora de Obra Universitaria

Dra. Norma Lilliana Galván Maciel, Rectora

M.S.P. Erick Murillo Jiménez, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pesafile, se podrán copiar tantas pesafiles como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adquisiciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

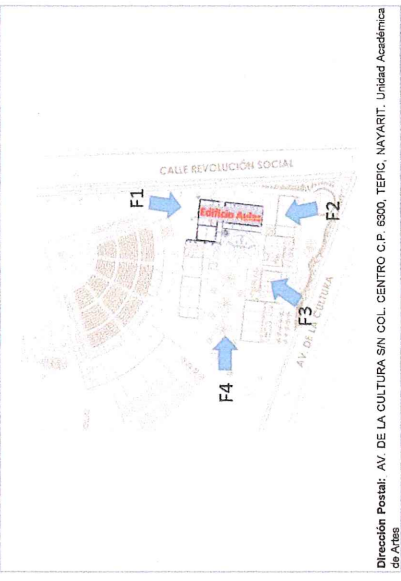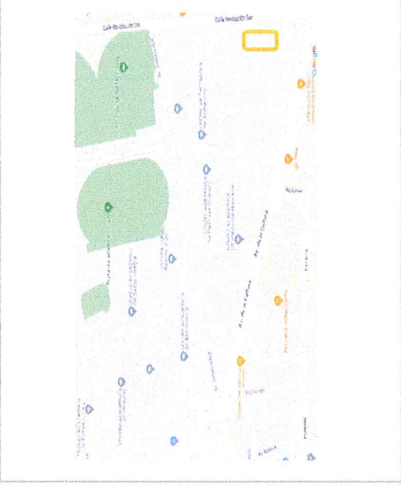

Porcentaje de avance
35.00%
