



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/0168/2025
Tepic, Nayarit; 10 de abril de 2025
ASUNTO: Remisión del
1er. informe trimestral
2025, FAM 2025.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI.
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito hacer entrega del 1er. informe trimestral 2025, de los proyectos autorizados, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2025; correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Se envía anexo el formato debidamente firmado y se entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y andrea.rangel@nube.sep.gob.mx

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA



Universidad
Autónoma
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO		CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA		ESPAZOS FISICOS/Ocupación (programado/realizado)		Acciones que sustentan el avance		Fechas Relativas		Observaciones		Reintegro a la TESUFE		Actas				
ID de acuerdo con el SIFAM	Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto (A)	Monto en Contratación (B)	Monto en Diferencia entre Contratación C y B	Modificación (D)	Reintegro (E) (A-B-D)	Nombres del Equip. o Materiales	Cantidad	Billetes	Iniciado	Terminado	Línea de Cultura	Fecha de Reporte	Estrategia (Acta Anexo)	Fecha	Acta

1	1	Edificio para laboratorios (Terminación: Instalaciones acabadas e instalaciones de Química Biológica y Farmacéutica)	X	\$ 4,851,152.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Laboratorios	10	751.62								
									Odobros	4	45.60								
									Sanitarios	4	65.92								
									Áreas comunes	1	643.89								
									Otros	12	199.97								
									TOTAL	31	1665.89								
2	2	Edificio de salas (Inicio: etapa: subutilización) en el edificio de la Unidad Académica de Ciencias de Medicina Veterinaria y Zootécnica.	X	\$ 4,042,026.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Salones de clase	11	533.50								
									Bibliotecas	1	96.50								
									Centros de cómputo	1	48.50								
									Sanitarios	2	40.00								
									Áreas comunes	5	394.00								
									Exposiciones para voz, video y aplicaciones	2	106.00								
									TOTAL	22	1200.50								
3	3	Edificio para la Unidad Académica de Artes (Rehabilitación de Instalaciones)	X	\$ 4,851,152.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Salones de clase	7	454.50								
									Talleres	1	101.41								
									Centros de cómputo	1	99.95								
									Sanitarios	1	69.07								
									Oficinas administrativas	1	35.29								
									Cuadros	1	69.95								
									Áreas comunes	3	475.88								
									TOTAL	15	1275.84								
4	4	Mantenimiento de los edificios Biblioteca Regine y Universidad Autónoma de Mayagüez, Ciudad de la Cultura	X	\$ 4,042,026.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Salones de clase	8	480.35								
									Laboratorios	3	349.20								
									Cuadros	1	51.20								
									Sanitarios	2	58.32								
									Áreas comunes	2	48.69								
									Séptico	3	41.00								
									TOTAL	19	1022.75								
5	5	Construcción de Edificio de Artes y Laboratorios para la Unidad Académica de Artes en la Unidad Académica de Abascofán	X	\$ 4,851,152.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Auditorio	1	3302.46								
									TOTAL	1	3302.46								
6	6	Construcción de Auditorio Universitario (Proyecto Estratégico)	X	\$ 18,197,747.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Salones de clase	8	555.40								
									TOTAL	8	3392.46								

Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.

Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.

Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.

Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.

Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.



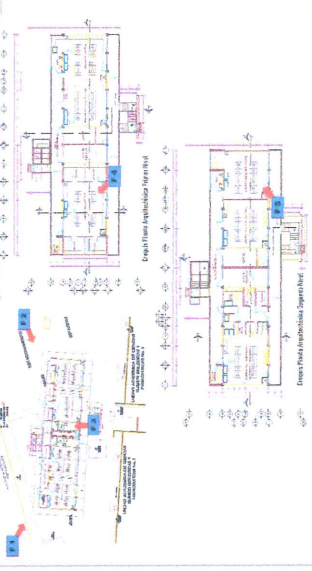
Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.

Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.








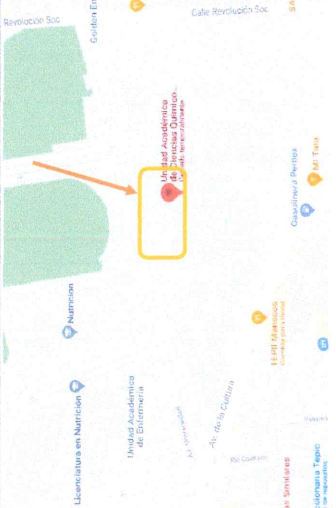



Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.

Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recurso suficiente.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO	Nombre de la obra:	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
1	Edificio para laboratorios (Terminación: instalaciones y acabados) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas	   UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.

FOTOS

GEORREFERENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CIRCUITO REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	Observaciones:
 Fotografía 1 (F1)	 Fotografía 2 (F2)	 Fotografía 5 (F5)
 Fotografía 3 (F3)	 Fotografía 4 (F4)	
 Fotografía 1 (F1)	 Fotografía 2 (F2)	
 Fotografía 3 (F3)	 Fotografía 4 (F4)	
 Fotografía 5 (F5)	 Fotografía 6 (F6)	

[Handwritten signature]

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROPIEDAD

1 Nombre de la obra:

Edificio para laboratorios (Terminación: Instalaciones y acabados) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas



Porcentaje de avance

0.00%


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO




Arq. Stephany Durán González, Directora de Obra Universitaria

M.S.P. Erick Martínez Gadoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

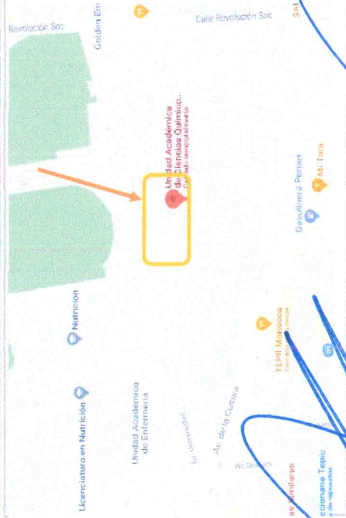

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

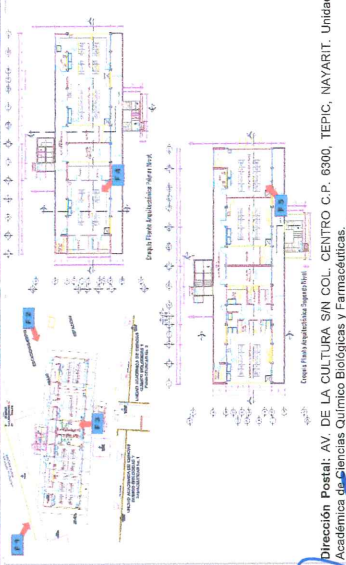

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.

Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.



2025
 EJERCICIO FISCAL EN EL QUE SE OTORGA EL RECURSO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES




DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
1er Trimestre 2025
 Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>PROYECTO: 2</p>	<p>Nombre de la obra: Edificio de aulas (tercera etapa: albanilerías, acabados e instalaciones) en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia.</p>
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p>	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p>
	
<p>Porcentaje de avance 0.00%</p>	<p>Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapulla Km 3.5 no name, 63700 Compostela, Nay, Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia</p>

FOTOS

	<p>Fotografía 1 (F1)</p>	<p>Arq. Stephany González, Directora de Obra </p>
	<p>Fotografía 2 (F2)</p>	<p>M.S.P. Erick Martín Jiménez, Comité de Planeación, Administración de Infraestructura </p>
	<p>Fotografía 3 (F3)</p>	<p>Dr. Norma Lidia Galván Inza, Rectora </p>
<p>Observaciones:</p>	<p>Fotografía 4 (F4)</p>	<p>Fotografía 5 (F5)</p>

NOTA:
 • Es muy importante que se tomen fotografías de todos los días. Para ello se anexa una plantilla, se podrán captar tantas plantillas como sean necesarias.
 Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para: antes, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
ORDENO EL RECIBIDO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance
0.00%

PROBIDAD 3


Nombre de la obra:

Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albanilería del módulo principal y cimentación del auditorio)


GEORREFERENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CIRCUITO REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

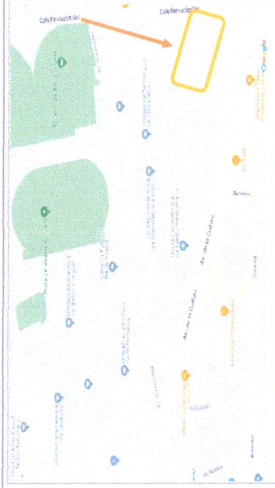

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Planta de Conjunto
Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300,
TEPIC, NAYARIT, Unidad Académica de Artes

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)



Fotografía 6 (F6)

Arq. ~~Stefano~~ González, Directora de Obra
Universitaria

M. P. ~~Eduardo~~ Jiménez Godoy, Secretario de
Planeación, Programación e Infraestructura

Dra. ~~Norma~~ Guzmán Méza, Rectora

NOTA:
* En cualquier momento que se avance respecto al proyecto de las obras. Para ello se anexa una pasada, se podrán copiar las fotografías con su consentimiento. Para el equipamiento, mantenimiento y reparaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO

4

Nombre de la obra:

Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura


UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Porcentaje de avance

0.00%

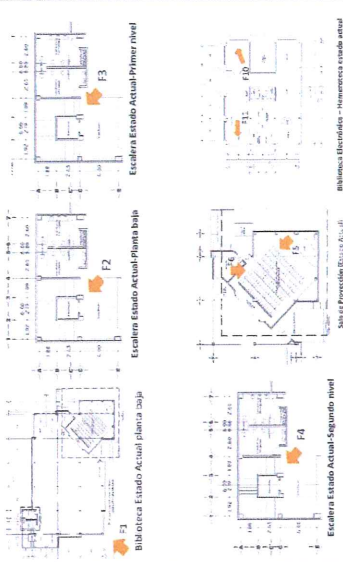

Biblioteca Magna - Hemeroteca estado actual
Sitio de Propiedad Pública A.G.U.I.
Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca


FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)

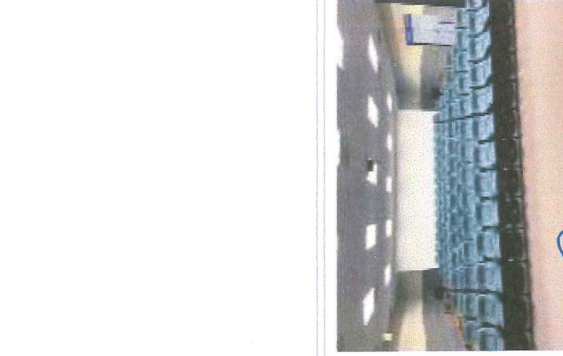

Observaciones:

2025

EREGICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 08/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO

4

Nombre de la obra:

Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

REFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Biblioteca Magna - Hemeroteca a estado actual
Sala de Proyección Estado Actual
Escalera Estado Actual Segundo nivel
Escalera Estado Actual Planta baja
Escalera Estado Actual Primer nivel

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)



[Handwritten signature]

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Trimestre y año que se reporta:
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance

0.00%

PROYECTO: **4**

Nombre de la obra:

Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

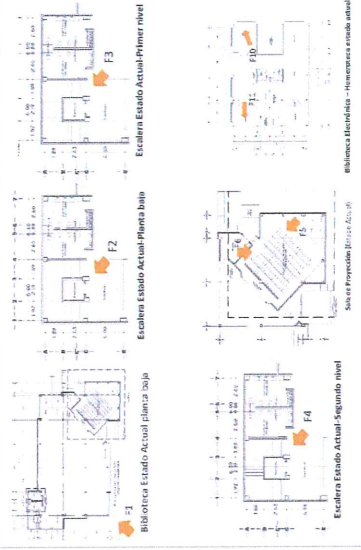

Biblioteca Estado Actual planta baja
Escalera Estado Actual Primer nivel
Escalera Estado Actual Segundo nivel
Biblioteca Estado Actual - Hemeroteca estado actual
Sala de Expediente Estado Actual

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca




Fotografía 6 (F6)

Arq. Sigismundo Quezada González, Directora de Obra
Universitaria



Fotografía 7 (F7)

M.S.P. Erick Martínez Jiménez Godoy, Secretario de Planeación,
Programación e Infraestructura



Fotografía 8 (F8)

Dra. Juana Cilia Galván Meza, Rectora

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotografico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podran copiar tantas planillas como sea necesario.

2025


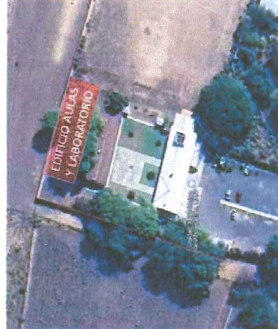


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA







FAM
FONDO DE APORTACIONES FAMILIARES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
1er Trimestre 2025
Fecha de elaboración: 06/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance 0.00%</p>	<p>5 Nombre de la obra: Construcción de Edificio de Aulas y Laboratorios para la Licenciatura de Enfermería en la Unidad Académica de Ahuacatlán</p> <p>GOBERNANCIA O CÍRCULO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 		<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: Río Amozonas 107, Ahuacatlán, Veracruz, Unidad Académica de Ahuacatlán</p>
--	--	--	--

FOTOS		Observaciones :
 <p>Fotografía 1 (F1)</p>	 <p>Fotografía 2 (F2)</p>	
 <p>Fotografía 3 (F3)</p>	 <p>Fotografía 4 (F4)</p>	
 <p>Fotografía 5 (F5)</p>	 <p>Fotografía 6 (F6)</p>	

NOTA: Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrá copiar y pegar las pestañas con el caso necesario.

Arq. *[Signature]*
Directora de Obras
Universitarias

M.S.P. *[Signature]*
Subdirector, Secretario de Planeación,
Programación e Infraestructura

Dra. *[Signature]*
Dra. Norma Lilián Salazar Flores, Rectora

2025

SUPERINTENDENCIA DEL QUÉ
OTORGAR EL RECURSO

FAM



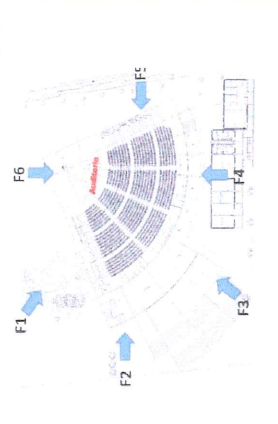
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA







Trimestre y año que se reporta
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0.00%	6 Nombre de la obra: Construcción de Auditorio Universitario (Proyecto Estratégico)	GEOFERENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS 
---	---	--	--

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COA, CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT

FOTOS		Observaciones :
 Fotografía 1 (F1)	 Fotografía 2 (F2)	
 Fotografía 3 (F3)	 Fotografía 4 (F4)	
 Fotografía 5 (F5)	 Fotografía 6 (F6)	

[Firma]
 Arg. J. Quintero González, Director de Obra
 Infraestructura

[Firma]
 M.S.P. Eric Martín-Juárez Godoy, Secretario de Planeación,
 Infraestructura e Infraestructura

[Firma]
 Dra. J. Lina Galván Ibarra, Rectora

NOTA:
 * Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrá ocupar tantas planillas como sea necesario.

2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAJÓN
OTROSÍO Y PISCO




FAM
FONDO DE ADAPTACIONES MULTIPLES


DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 03/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

<p>7 Nombre de la obra Construcción Centro de Aulas y Talleres para la Unidad Académica de Artes (Expresión Artística y Diseño Urbano)(Proyecto Estratégico)</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN CUL. CENTRO C.P. 0300, TERC. INAVARIT. UMSA Academia de Artes</p>
<p>GEOMERFENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>GRUPO REFERENCIAL EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 
<p>Porcentaje de avance 0.00%</p>	<p>Observaciones :</p>

FOTOS	
 <p>Fotografía 1 (F1)</p>	<p>Observaciones :</p>
 <p>Fotografía 2 (F2)</p>	<p>Observaciones :</p>
 <p>Fotografía 3 (F3)</p>	<p>Observaciones :</p>
 <p>Fotografía 4 (F4)</p>	<p>Observaciones :</p>
 <p>Fotografía 5 (F5)</p>	<p>Observaciones :</p>

Al Sr. **[Signature]** Rector, Universidad

Al Sr. **[Signature]** Guey, Secretario de Planeación, Universidad

Al Sr. **[Signature]** Jarama, Luján Mesa, Rector, Universidad

NOTA
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrá copiar tantas plantillas como sea necesario.



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/0167/2025
Tepic, Nayarit; 10 de abril de 2025
ASUNTO: Remisión del
1er. informe trimestral
2025, FAM 2024.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI.
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito hacer entrega del 1er. informe trimestral 2025, de los proyectos autorizados, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2024; correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Se envía anexo el formato debidamente firmado y se entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y andrea.rangel@nube.sep.gob.mx

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA



DATOS DE LA UNIVERSIDAD
 Nombre: **Universidad Autónoma de Nayarit**
 Entidad federativa: **Nayarit**
 Clave 911: **UNSD0003M**
 Nombre: **Erick Melina Jiménez Cebal**
 Cargo: **Coordinador de Planeación e Infraestructura**
 Teléfono: **01 (31) 211 8600, ext. 8199**
 Correo electrónico: **eckj@unadn.mx**

RESPONSABLES
 Nombre: **Stephany Guzmán González**
 Cargo: **Coordinadora de Planeación e Infraestructura**
 Teléfono: **01 (31) 211 8600, ext. 6039**
 Correo electrónico: **stepy23@unadn.mx**

ID de acuerdo con el SIPAM	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA				DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO				DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO				Observaciones	Revisado a la ESDFE		Actas	
			No. (s) de Contrato (s)	Inicio	Término	Monto Contratado (B)	Monto pagado (D)	Resumen (E) B-D	Espectos de cumplimiento (programado/autorizado)	Acciones que sustituyen el avance	% de avance	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de Recepción (Acta de Recepción)		Fecha de Recepción (Acta de Recepción)	Monto (Acta de Recepción)	Monto (Acta de Recepción)	
1	Edificio para laboratorios académicos en la Unidad Académica de Ciencias Farmacéuticas y Químicas	X	UN-SPH-DOU-CP-006-2024	27/06/2024	30/06/2025	7,770,683.71	4,593,772.80	2,496,227.15	10	751.62	75%	27/06/2024	30/06/2025	200,000.00					
2	Edificio para la Unidad Académica de Ingeniería y Arquitectura	X	UN-SPH-DOU-CP-008-2024	21/06/2024	30/06/2025	7,770,683.71	726,082.25		31	1,693.89	0%	21/06/2024	30/06/2025						
3	Edificio de sala (s) para la Unidad Académica de Medicina y Zootecnia	X	UN-SPH-DOU-CP-005-2024	08/07/2024	07/12/2024	5,000,000.00	2,290,665.95	2,460,334.45	10	503.00	57%	08/07/2024	20/03/2025						

[Handwritten signature]



Nombre: Universidad Autonoma de Mayait
Entidad: Educacion Mayait
Calle: 211, TAMBOSCOYAMA

Nombre: ERIC MARTIN JULIANES GONDOY
Cargo: Secretario de Planeacion, Programacion e Infraestructura
Correo electronico: eric.jmendo@uan.edu.mx

Nombre: Stephany Caceres Gonzalez
Telefono: 01 (311) 211 8800, ext. 8529
Correo electronico: stepy93@uan.edu.mx

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
DATOS DE LA UNIVERSIDAD

RESPONSABILIDAD

Obras y Mantenimiento

Categoría	Código	Cantidad	Unidad	Valor Unitario (S/.)	Valor Total (S/.)	Observaciones	Global del Proyecto	Avance (%)	Descripción de los trabajos y estado de avance
4	E-011	60	m ²	2,816,800.00	168,000.00	Edificio de aulas de la Unidad Académica de Estudios Escenarios, canceladas y obra exterior	GLOBAL DEL PROYECTO	86%	Derivado del mantenimiento de las cuentas de la Universidad de la Unidad Académica de Estudios Escenarios, la suma de pagarés de estimaciones por cada concepto es de 168,000.00 dólares americanos, el cual se recibe en la Dirección de Obras de la Universidad de Lima, donde se incluye el procedimiento de terminación anticipada de la obra UAN-ACABADOS, CANCELERÍA Y OBRA EXTERIOR, para lo cual se emite un presupuesto de 168,000.00 dólares del contrato de esta obra. La Dirección de Obras Universitarias derivado del análisis de estado del expediente técnico de la obra, las circunstancias que impiden la continuación de los trabajos programados. Por lo anterior, se procedió a iniciar el Proceso Contractivo, por razones de interés general y causas justificadas que no son imputables al contratista, situación derivada de la modificación del contrato y de la Ley de Obligación del Estado de Mayait, así como también por la pérdida de posesión de los tiempos y entrega de obra, la cronificación de
		8	Adidas	400.35	168,000.00	Después de la emisión que los tramites para el pago de las estimaciones no se pudieron realizar debido a la pérdida de			
		1	Calcomanía	51.20	51.20	Después de la emisión que los tramites para el pago de las estimaciones no se pudieron realizar debido a la pérdida de			
		3	Laboratorio	56,000.00	168,000.00	Después de la emisión que los tramites para el pago de las estimaciones no se pudieron realizar debido a la pérdida de			
		2	Señalización	29,000.00	58,320.00	Después de la emisión que los tramites para el pago de las estimaciones no se pudieron realizar debido a la pérdida de			
		3	Otros	14,000.00	44,000.00	Después de la emisión que los tramites para el pago de las estimaciones no se pudieron realizar debido a la pérdida de			
					TOTAL	974,120.00	168,000.00		

\$ 20,333,280.00

\$ 726,305.29

\$ 18,111,054.37

\$ 15,315,193.36

Ab. Stephany Caceres Gonzalez - Directora de Obras Universitarias

M.S.P. Erick Martín Julianes Gondoy - Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Dir. Verónica Liliana Galván Nieto - Rectora

2024

RECURSOS FINANCIEROS DEL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES





DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:





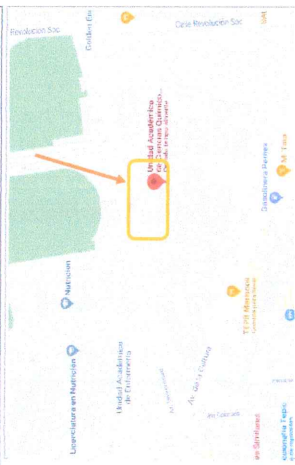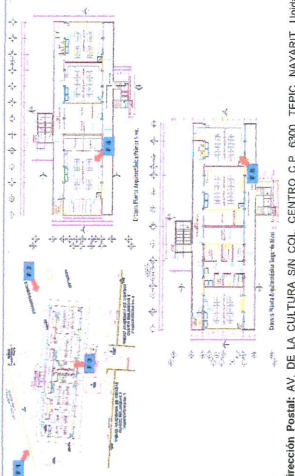



1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance</p> <p>79.00%</p>	<p>1 Nombre de la obra: Edificio para laboratorios (continuidad: acabados, cancelerías) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.</p> 	<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL CENTRO C.P. 6300, TEPIC, MAYA R.T. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.</p>
--	---	--	---

FOTOS

 <p>Fotografía 1 (F1)</p>	 <p>Fotografía 2 (F2)</p>	<p>Observaciones: Obra teniendo ejecutado al 85%, acabados en modulo de baños 100%, instalación eléctrica al 85%, acabados en laboratorios 90%, cancelerías interiores al 100%.</p>
 <p>Fotografía 3 (F3)</p>	 <p>Fotografía 4 (F4)</p>	 <p>Fotografía 5 (F5)</p>
<p>Arq. Silvana Sánchez González, Directora de Obra Universitaria.</p> 	<p>M.S.P. Erick Martín Amador Godoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura</p> 	<p>Dr. Norma Luján Guzmán Meza, Rectora</p> 

NOTA

Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

EFICIENCIA FISCAL EN EL USO
OTORGADO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 08/04/2025




REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO 2 Nombre de la obra:

Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albanilería del módulo principal y cimentación del auditorio)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

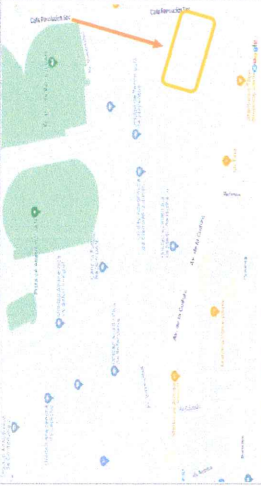

Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300,
TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Artes

Porcentaje de avance
0.00%

FOTOS



F1

Fotografía 1 (F1)



F2

Fotografía 2 (F2)



F3

Fotografía 3 (F3)



F4

Fotografía 4 (F4)



F5

Fotografía 5 (F5)



F6

Fotografía 6 (F6)

Arq. Stephanie Hernández González, Directora de Obra
Universitaria

M.S.P. Efraim Martín Jiménez Godoy, Secretario de
Comunicación, Programación e Infraestructura

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todos los avances. Para ello se anexa una plantilla, se podrá copiar y pegar en los espacios correspondientes con lo necesario. Para equipamiento, mantenimiento y asociaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

ERUDICIÓN FISCAL EN EL OMBE
GRUPO EL RECURSO




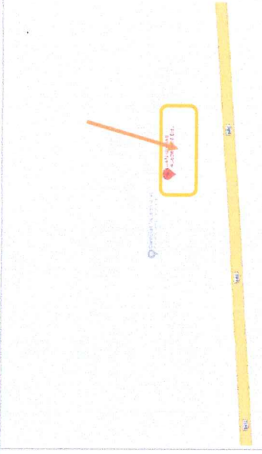
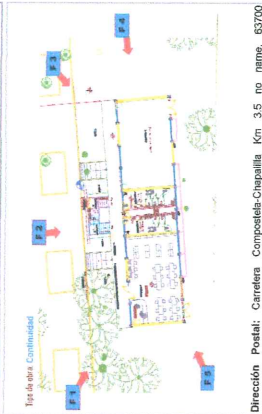
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES










DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 06/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 <p>Porcentaje de avance 57.00%</p>	<p>PROYECTO 3</p>	<p>Nombre de la obra: Edificio de aulas (segunda etapa: estructura y azotes) Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia</p>	<p>UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>
<p>GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO</p> 		<p>CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO</p> 	<p>Termina Construcción</p>  <p>Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapailla Km. 3.5 no nama, 63700 Compostela, Nay, Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia</p>

FOTOS		
<p>Fotografía 1 (F1)</p> 	<p>Fotografía 2 (F2)</p> 	<p>Fotografía 5 (F5)</p>  <p>Observaciones: Terminación de las del primer nivel, muros, columnas, techos y losa en estado en seguridad nivel, salidas eléctricas y voz y datos en losa y muros de concreto de segundo nivel, cimentación en planta baja zapata ZC250 100%.</p>
<p>Fotografía 3 (F3)</p> 	<p>Fotografía 4 (F4)</p> 	<p>Fotografía 6 (F6)</p> 
<p>Arq. Stegmyr Guzmán González, Directora de Obra Universitaria</p> 	<p>M.S.P. Erick Maripán Jumbo Godoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura</p> 	<p>Dr. Norma Lilian Galván Mejía, Rectora</p> 

NOTA:
* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y acciones, en especial, se recomienda que se capture la misma loma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2024

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

FAM



FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR, UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
OFICINA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCION DEL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA





Tercer y sin que se reporte
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 06/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PROGRESO DE AVANCE TRIMESTRAL
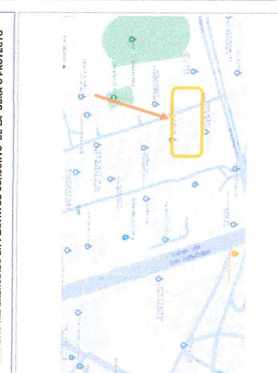
<p>4</p> <p>Nombre de la obra: Edificio de aulas de la Unidad Académica de Enfermería (continuidad: acabados, cancelerías y obra exterior)</p> <p>CORRENCIA O CIRCULO DE LOCALIZACION DE LA OBRA O PROYECTO</p>		<p>UBICACION DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS</p>  <p>Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 0300, TEPIC, MAYAGUEZ, BALIDECA MAGNA Primer Bloq</p>
--	--	--

Porcentaje de avance
86.00%

FOTOS	
 <p>Fotografía 1 (F1)</p>	 <p>Fotografía 2 (F2)</p>
 <p>Fotografía 3 (F3)</p>	 <p>Fotografía 5 (F5)</p>

Observaciones :
Obra teniendo ejecutado al 85%, acabados en módulo de baños, 100%, banquetas exteriores al 100%, instalación de áreas acondicionadas al 100%, acabados en aulas al 50%.

Dr. Robinson Torres, Director de Obra
UNIVERSIDAD

M.S.P. Erick Martín Hernández, Secretario de Planación,
Programación y Infraestructura

Dr. Moisés Torres, Coordinador de Obra, Rectoría

NOTA

* Es el mínimo que se debe reportar fotográficamente de todas las obras. Para esto se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para cada planta, mantenimiento y reparaciones, en respuesta, se recomendará que se capture la misma toma, misma fotografía y lugar para aplanillas, durante y después de la obra.
