



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/006/2025
Tepic, Nayarit; 10 de Enero de 2025
ASUNTO: Remisión del
4to. informe trimestral
2024, FAM 2024.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito hacer entrega del 4to informe trimestral 2024, de los proyectos autorizados, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2024; correspondiente al periodo 01 de octubre al 31 de diciembre de 2024.

Se envía anexo el formato debidamente firmado y se entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx y claudia.duenas@nube.sep.gob.mx. Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA



Universidad
Autónoma
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Archivo

**Secretaría
de Planeación,
Programación
e Infraestructura**

Torre de Rectoría 2do. Piso
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo"
C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8786



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
Entidad Federativa: Nayarit
Código HT: 18MS001BM

Nombre: Erick Martín Jiménez Godoy
Cargo: Director de Planeación e Infraestructura
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786
Correo electrónico: erick.jimenez@uan.edu.mx

París

RESPONSABLES

Nombre: Stephanie Quispe González
Cargo: Directora de Obra Universitaria
Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8838
Correo electrónico: stepy33@uan.edu.mx

Obras y Mantenimiento

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO																								
CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA																								
ID de acuerdo con el SI/FA	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto	Monto autorizado (A)	No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado entre Autorizado y Contratado (C) = A-B	Monto ejecutado (D)	Reservante (E) = B-D	Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)				Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales		Observaciones	Retiro a la TEOFFE		Actas	
					INICIO	TÉRMINO						Nombre del Espacio/equipo	Cantidad	Metros Cuadrados	Inicio			Término	Fecha de Captura		Importe de pago	Entrega-Recapitulación (finiquito) MONTO	Acta de Entrega-Recapitulación (finiquito) MONTO	
1	Edificio para laboratorios (continuidad: acabados, carpintería) en la Unidad Académica de Química y Farmacéuticas.	X	\$ 7,000,000.00	UAN-SPP-LOCAL-CP-005-2024	27/05/2024	26/09/2024	\$ 7,000,000.00	GILBERTO PARTIDA LOPEZ	\$ -	\$ 4,933,772.85	\$ 2,496,227.15	Laboratorios	10	751.62	Durante el presente trimestre se realizó el trámite para pago de la estimación 3 y sus respectivas deducciones.	73%	GLOBAL DEL PROYECTO		Posterior a la fecha del reporte del trimestre anterior, la Dirección de Obra Universitaria informó sobre el convenio de modificación del contrato, con fecha del 10 de agosto de 2024, en donde se aumenta la inversión total contratada, debido a que se requieren conceptos necesarios para la correcta ejecución de la obra.					
												Cubículos	4	45.80										
												Sanitarios	4	65.92										
												Áreas comunes	1	643.88										
												Otros	12	188.97										
												TOTAL	31	1695.99										
2	Edificio para la Unidad Académica de Artes Académica de Artes cimentación y albañilería del módulo principal y cimentación del auditorio)	X	\$ 8,500,000.00	UAN-SPP-LOCAL-CP-005-2024	21/02/2024	20/03/2025	\$ 7,773,083.71	LUIS RAMÓN LÓPEZ DEL REAL	\$ 726,936.29	\$ 2,311,919.12	\$ 5,441,144.59	Aulas	8	512.00	El monto que se indica como ejercido, corresponde al anticipo contratado, que durante el presente trimestre se tramitó.	30%	GLOBAL DEL PROYECTO							
												Sanitarios	1	69.08										
												Laboratorios	1	48.00										
												Talleres	3	271.96										
												Aulas dedicadas	1	32.00										
												Administrativo	5	393.27										
3	Edificio de aulas (segunda etapa: estructura y azotea) Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia	X	\$ 5,000,000.00	UAN-SPP-LOCAL-CP-005-2024	08/07/2024	07/12/2024	\$ 5,000,000.00	EDGAR ENRIQUE LOPEZ MIRAMONTES	\$ -	\$ 2,590,865.55	\$ 2,409,334.45	Cubículos	29	302.00	Durante el presente trimestre que se reporta se realizó el trámite para pago de la estimación 2 y sus respectivas deducciones.	52%	GLOBAL DEL PROYECTO		Posterior a la fecha del reporte del trimestre anterior, la Dirección de Obra Universitaria informó sobre el convenio de modificación del contrato, con fecha del 10 de agosto de 2024, en donde se aumenta la inversión total contratada, debido a que se requieren conceptos necesarios para la correcta ejecución de la obra.					
												Sanitarios	1	54.00										
												Centro de cómputo	1	54.00										
												Administrativo	11	140.00										
												Áreas comunes	5	384.00										
												Otros	2	106.00										
TOTAL	60	1688.00																						

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL
QUE OTORGA EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Presupuesto y año que se reporta

4to Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 08/01/2025

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad Federativa: Nayarit

Código 011: 18MSU0019M

Nombre: Erick Martín Jiménez Godoy

Cargo: Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8786

Correo electrónico: erick.jimenez@uan.edu.mx

Nombre: Stephanie Quintero Contreras

Cargo: Directora de Obra Útil

Teléfono: 01 (311) 211 8800, ext. 8838

Correo electrónico: step33@uan.edu.mx

Otras y Mantenimiento

Planeación

RESPONSABLES

GLOBAL DEL PROYECTO	Durante el presente trimestre que se reporta se realizó el trámite para pago de las estimaciones respectivas retenciones.		Posterior a la fecha del reporte del trimestre anterior, la Unidad de Obra Útil de la Universidad informó sobre el convenio de modificación del contrato de obra pública del 10 de mayo de 2024, en donde se aumentó la inversión total contratada, debido a que se requirieron conceptos necesarios para la correcta ejecución de la obra.	
	Aulas	Cubículos	Sanitarios	Otros
8	480.35	1	51.20	
3	340.20			
2	58.32			
3	44.00			
TOTAL	2	974.07		
\$ 26,353,280.00		\$ 726,535.29	\$ 12,443,953.47	\$ 13,195,400.24
\$ 25,626,363.71				

Edificio de aulas de la
Unidad Académica de
Enfermería (continuidad de
acabados, cancelerías y
obra exterior)

IVAN MARCELO
SALAZAR HERRERA

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE NAYARIT

12/09/2024

13/05/2024

\$ 5,853,200.00

\$ 3,016,595.95

\$ 2,834,094.00

\$ 340.20

\$ 51.20

\$ 480.35

Aro, Stephany Quintero Contreras, Directora de Obra Útil

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy - Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Dra. Norma Liliana Galván Díaz - Rectora

2024

EL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
4to Trimestre 2024



Fecha de elaboración: 08/07/2025

PROYECTOS

1

Nombre de la obra: Edificio para laboratorios (continuidad: acabados, cancelerías) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.

Georreferencia o croquis de localización de la obra o proyecto

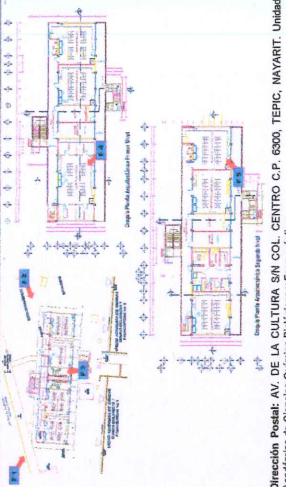

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

Porcentaje de avance
72.00%

Ubicación Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.

FOTOS




Fotografía 1 (F1)

Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)

Fotografía 2 (F2)



Fotografía 5 (F5)

Fotografía 6 (F6)




Arq. Stephen González González, Directora de Obra
Universitaria

M.S.P. Erick Maximiliano Jaramillo Andrey, Secretario de Planeación,
Programación e Infraestructura

Dra. Norma Liliana Galván Mesa Rodríguez

NOTA:
Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

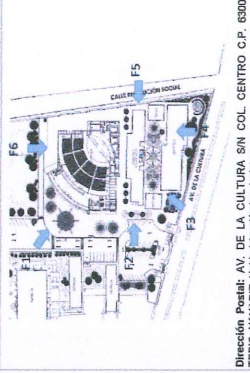Proyecto 2		Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albanilería del módulo principal y albanilería del auditorio)		UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
 Procedencia 2 Nombre de la obra: Georeferencia o croquis de localización de la obra o proyecto Porcentaje de avance 30.00%				Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 8300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Artes	
	FOTOS				
 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	 F6
Fotografía 1 (F1)		Fotografía 2 (F2)		Fotografía 3 (F3)	
Fotografía 4 (F4)		Fotografía 5 (F5)		Fotografía 6 (F6)	
Arq.  González, Directora de Obras Universitarias		M. Sc.  Aguilar, Secretario de Planeación, Infraestructura y Administración		Dra.  Galván, Rectora	

2024

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

4to Trimestre 2024

Fecha de elaboración: 08/01/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Proyecto

Nombre de la obra:

Edificio de aulas (segunda etapa: estructura y azotea) Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIANDO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapala km 3.5 no. 83700 Compostela, Nte. Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Porcentaje de avance

54.00%

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)

Observaciones: Obra en proceso teniendo a la fecha, terminación de losa del primer nivel, muros, columnas, labios y losa pendiente en segundo nivel, salidas eléctricas y voz y datos en losa y muros de concreto de segundo nivel, cimentación en planta baja zapata ZC50 100%

Arq. Stephanie González, Directora de Obra
Universitaria

NOTA

* Es muy importante que se anexo reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adicciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar, para el antes, durante y después de la obra.

M.S.P. Erick Muñoz-Jiménez, Secretario de Planeación,
Programación e Infraestructura

Dra. Norma Liliana Galván Mesa, Rectora

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

4
 000000

Nombre de la obra:

Edificio de aulas de I

Edificio de aulas de I

Edificio de aulas de I

Edificio de aulas de I



Porcentaje de avance

59.00%

