



Universidad
Autónoma
de Nayarit

UAN/SPPI/0168/2025
Tepic, Nayarit; 10 de abril de 2025
ASUNTO: Remisión del
1er. informe trimestral
2025, FAM 2025.

DR. EDUARDO GERARDO ROSAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, DGESUI.
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito hacer entrega del 1er. informe trimestral 2025, de los proyectos autorizados, con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) ejercicio 2025; correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Se envía anexo el formato debidamente firmado y se entrega vía correo electrónico a las siguientes direcciones:

dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, sconde@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, claudia.duenas@nube.sep.gob.mx y andrea.rangel@nube.sep.gob.mx

Sin más por el momento, agradezco su atención y el apoyo que brinda a nuestra institución.

Reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"

M.S.P. ERICK MARTÍN JIMÉNEZ GODOY
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA



Universidad
Autónoma
de Nayarit

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nombre: Universidad Autónoma de Mayatlán
Clave 911, TMSU0010M
Nombre: Erick Martín Juárez Godoy
Cargo: Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura
Correo electrónico: erick.juarez@unam.mx

Nombre: Stephen Quispe González
Cargo: Director de Obras Universitarias
Correo electrónico: steph33@unam.mx

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

Objeto y Mantenimiento

2025

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

FAM

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCION DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Impreso y año que se reporta
ter Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 06/04/2025



Nombre: Universidad Autónoma de Nayarit
Ciudad: Tepic, Nayarit
Código Postal: 66200

Nombre: Erick Martí Rodríguez Cárdenas
Cargo: Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura
Teléfono 01 (311) 211 8600, ext. 4756
Correo electrónico: erick.martir@uan.mx

7 7 Unidad Académica de Artes y Diseño (UADAD)
(Proyecto Estratégico)

\$ 10,916,647.93

\$ 21,725,104.68

Transmisión

\$ 90.00

\$ 51,725,104.68

Talleres

4

276.30

276.12

1110.82

TOTAL

\$0.00

\$0.00

Nombre: Stephany Quintero Coronado
Cargo: Asesora de Planeación, Programación e Infraestructura
Teléfono 01 (311) 211 8600, ext. 4838
Correo electrónico: stephany23@uan.mx

0%

Se dará inicio a los procedimientos una vez que se cuente con recursos y certeza

0%

Dr. Iván Lilián Galván Irujo - Rector

Dr. Erick Martí Rodríguez Cárdenas - Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Dr. Erick Martí Rodríguez Cárdenas - Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

2025

ESQUEJO FISCAL EN EL QUE
OTORGO EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

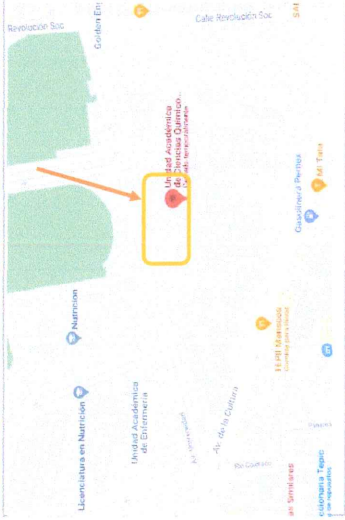
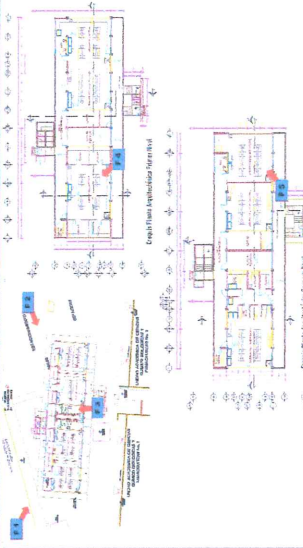
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROYECTO	1	Nombre de la obra:	Edificio para laboratorios (Terminación: instalaciones y acabados) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas
GEOREFERENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO			
CIRCUITO REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO			
UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	 Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas.		

FOTOS



Fotografía 1 (F1)



Fotografía 2 (F2)



Fotografía 3 (F3)




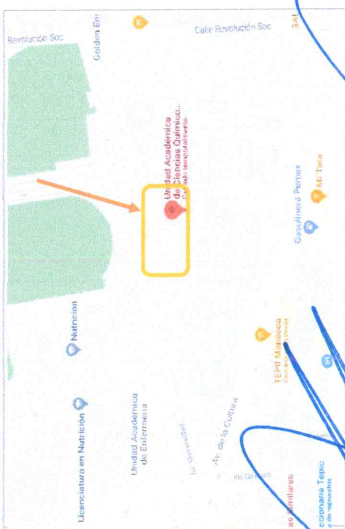
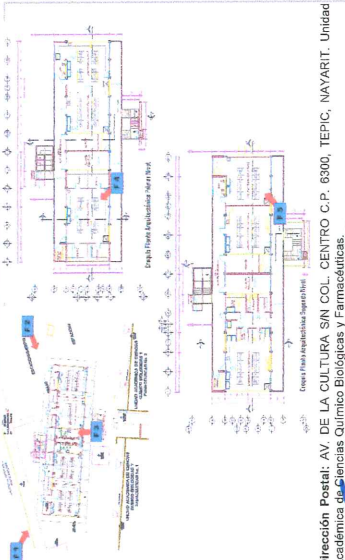
Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)

Observaciones:



REPORTERO FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL			
PROYECTO	Nombre de la obra:	Edificio para laboratorios (Terminación: Instalaciones y acabados) en la Unidad Académica de Ciencias Químico Biológicas y Farmacéuticas	
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS	
			

Arq. Stephany Durán González, Directora de Obra Universitaria

M.S.P. Erick Martínez Gadoy, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura

Dra. Norma Liliana Galván Meza, Rectora

P.A.

NOTA

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2025

BAJOCOSTO FISCAL EN EL QUE SE FORME EL INCREMENTO

FAM

FOONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta

1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración:

09/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRECEDENCIA

2

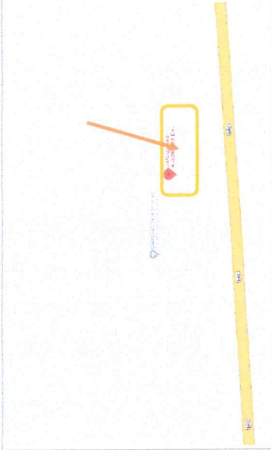
Nombre de la obra:

Edificio de aulas (tercera etapa: albanilerías, acabados e instalaciones) en la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

GEOREFERENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Dirección Postal: Carretera Compostela-Chapulla Km 3.5 no name, 63700 Compostela, Nay, Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Porcentaje de avance

0.00%

FOTOS

Fotografía 1 (F1)



Arq. Stephany González, Directora de Obra

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Fotografía 2 (F2)



M.S.P. Erick Martín Jiménez, Coordinador de Planeación, Subdirección de Infraestructura

Fotografía 3 (F3)



Arq. Stephany González, Directora de Obra

Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Fotografía 4 (F4)



M.S.P. Erick Martín Jiménez, Coordinador de Planeación, Subdirección de Infraestructura

Fotografía 5 (F5)



Arq. Norma Lidia Galván Méza, Rectora

Observaciones:

NOTA:

Es muy importante que se anote el porcentaje de avance de la obra. Para ello se anota una postal, se podrán capturar varias postales con el mismo propósito. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para las fotos, durante y después de la obra.

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

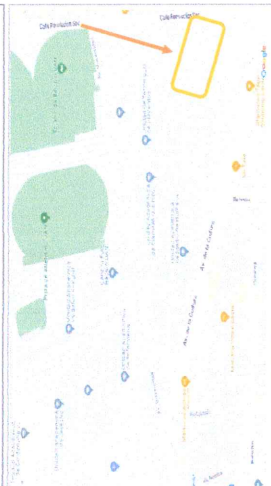

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

	PRIMICIA 3	Nombre de la obra: Edificio para la Unidad Académica de Artes (segunda etapa: cimentación y albanilería del módulo principal y cimentación del auditorio)	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
Porcentaje de avance 0.00%	GEOREFERENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO	CIRCUITO REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO	Planta de Conjunto
			Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT, Unidad Académica de Artes

FOTOS

		
Fotografía 1 (F1)	Fotografía 2 (F2)	Fotografía 3 (F3)
		
Fotografía 4 (F4)	Fotografía 5 (F5)	Fotografía 6 (F6)
Arq. Stefano González González, Directora de Obra Universitaria	M. P. Edgar Martínez Martínez Cordero, Secretario de Planeación, Programación e Infraestructura	Dra. Norma Lilia Gayán Méza, Rectora

NOTA:
* Es muy importante que se anexe copia fotográfica de todas las obras. Para ello se anexa una planilla, se podrán copiar tantas planillas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y rescacados, en especial se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para antes, durante y después de la obra.

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIORIDAD

Nombre de la obra:

4	Nombre de la obra:	Mantenimiento de lo
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

Ciudad de la Cultura

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Porcentaje de avance

0.00%



Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA S/N COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIC, NAYARIT. Biblioteca Magna y Hemeroteca

Fotografia 3 (F3)



Fotografía 4 (F4)



Fotografía 5 (F5)



2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE
OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 09/04/2025

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



PROYECTO:

4

Nombre de la obra:

Mantenimiento de los edificios Biblioteca Magna y Hemeroteca en la Universidad Autónoma de Nayarit, Ciudad de la Cultura


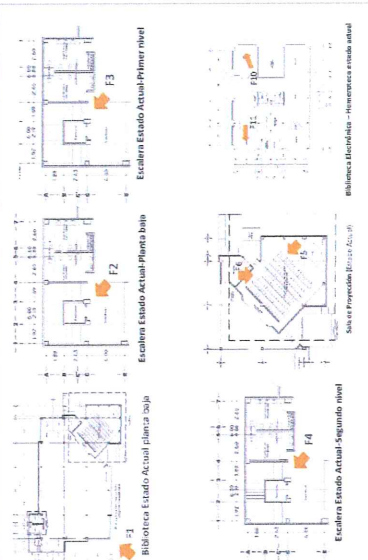
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Fotografía 6 (F6)

Arq. Sigismundo Quezada González, Directora de Obra
Universitaria

Fotografía 7 (F7)

M.S.P. Erick Martín Jiménez Zedillo, Secretario de Planeación,
Programación e Infraestructura

Fotografía 8 (F8)

Dra. María Celia Galván Meza, Rectora

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrán copiar tantas plantillas como sea necesario.

2025

SUPLENTE FISCAL DE EL CEN
OTROBO Y RECARGO

FAM





FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISCAL

Trimestre y año que se reporta
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 05/04/2025

REPORTE FOTOGRAFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

 Porcentaje de avance 0.00%	6 Nombre de la obra: Construcción de Auditorio Universitario (Proyecto Estratégico)	UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS
GEORREFERENCIA O CIRCUITO DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO 	CIRCUITO REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO 	
FOTOS		
 Fotografía 1 (F1)	 Fotografía 2 (F2)	 Fotografía 3 (F3)
 Fotografía 4 (F4)	 Fotografía 5 (F5)	 Fotografía 6 (F6)
Observaciones:		
 Arg. Jazmín Quetzani González, Directora de Obra		
 M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación, Infraestructura e Infraestructura		
 Dra. Jazmín Lina Galván Mesa, Rectora		

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una plantilla, se podrá ocupar tantas plantillas como sea necesario.





0.00%

7 Nombre de la obra:

7	Nombre de la obra:	Construcción Centro
GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO		

eres para la Unidad Académica de Artes (Expresión Artística y



Dirección Postal: AV. DE LA CULTURA SIN COL. CENTRO C.P. 6300, TEPIG, NAYARIT. Unidad Académica de Artes



Fotografia 1 (F1)



Fotografia 2 (F2)



Fotografia 3 (F3)



Fotografia 4 (F4)

Observaciones :

Arq. Stephany Carazada González, Directora de Obra
Universitaria

M.S.P. Erick Martín Jiménez Godoy, Secretario de Planeación,

Dra. Norma Liliana Salván Méza, Rectora

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una peseta, se podrán copiar tantas pesetas como sea necesario.
